PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	15 / 05 / 2017	Codice ISTAT
1	Regione	FRIULI-VENEZIA GIULIA	06
2	Provincia	Pordenone	093
3	Comune	Pordenone	033
4	Località abitata	Pordenone	10001
5	Sezione censuaria		
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000000031	00
7	Identificativo Unità Strutturale	999	
8	Identificativo Area di Emergenza		
9	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000104	b
		c	d
10	Indirizzo	Via Trieste	11 Civico
12b	Denominazione	Palestra	12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata ● Sì ○ No — 14 ○ Interna ○ D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) — ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA — ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 — 19 PIANI INTERRATI ○ 0 ● 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ○ ≤2,50 ○ 2,50-3-50 ● 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 VOLUME UNICO SU AC ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 462

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ○ C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ○ Muratura ● Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA ● Buona ○ Cattiva ○ Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI ○ Sì ● No — 28 PIANO PILOTIS ○ Sì ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente — 31 STATO MANUTENTIVO ○ Carente ○ Sufficiente ● Buono

PROPRIETÀ — 32 ✓ Pubblica — 33 ☐ Privata

34 MORFOLOGIA ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ● Instabile

Tipo instabilità — 38 ☐ Frana — 39 ✓ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 ☐ Interferente con l'edificio strategico — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

Rischio PAI ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA — ○ Coordinamento interventi 001 ○ Soccorso sanitario 002 ○ Intervento operativo 003 ● Altro 024

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA — ☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc — 49b ✓ Ricovero in emergenza

DESTINAZIONE D'USO — 50 Uso originario — 51 Uso attuale S67

52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1925 — 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1925

ESPOSIZIONE — 54 Persone mediamente presenti 50 — 55 Ore fruizione nel giorno 8 — 56 Mesi fruizione nell'anno 12

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI
- 57 Interventi dopo la costruzione ○ Sì ● No — 58 Anno
- 59 ☐ Ampliamenti
- 60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
- 61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
- 62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
- 63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
- 64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
- 65 ☐ Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA

66 Codice evento	67 Data 00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento
69 Codice evento	70 Data 00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento
72 Codice evento	73 Data 00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento

75 VERIFICA SISMICA ○ Effettuata (cofinanziata da DPC) ○ Effettuata (altri finanziamenti) ● Non effettuata

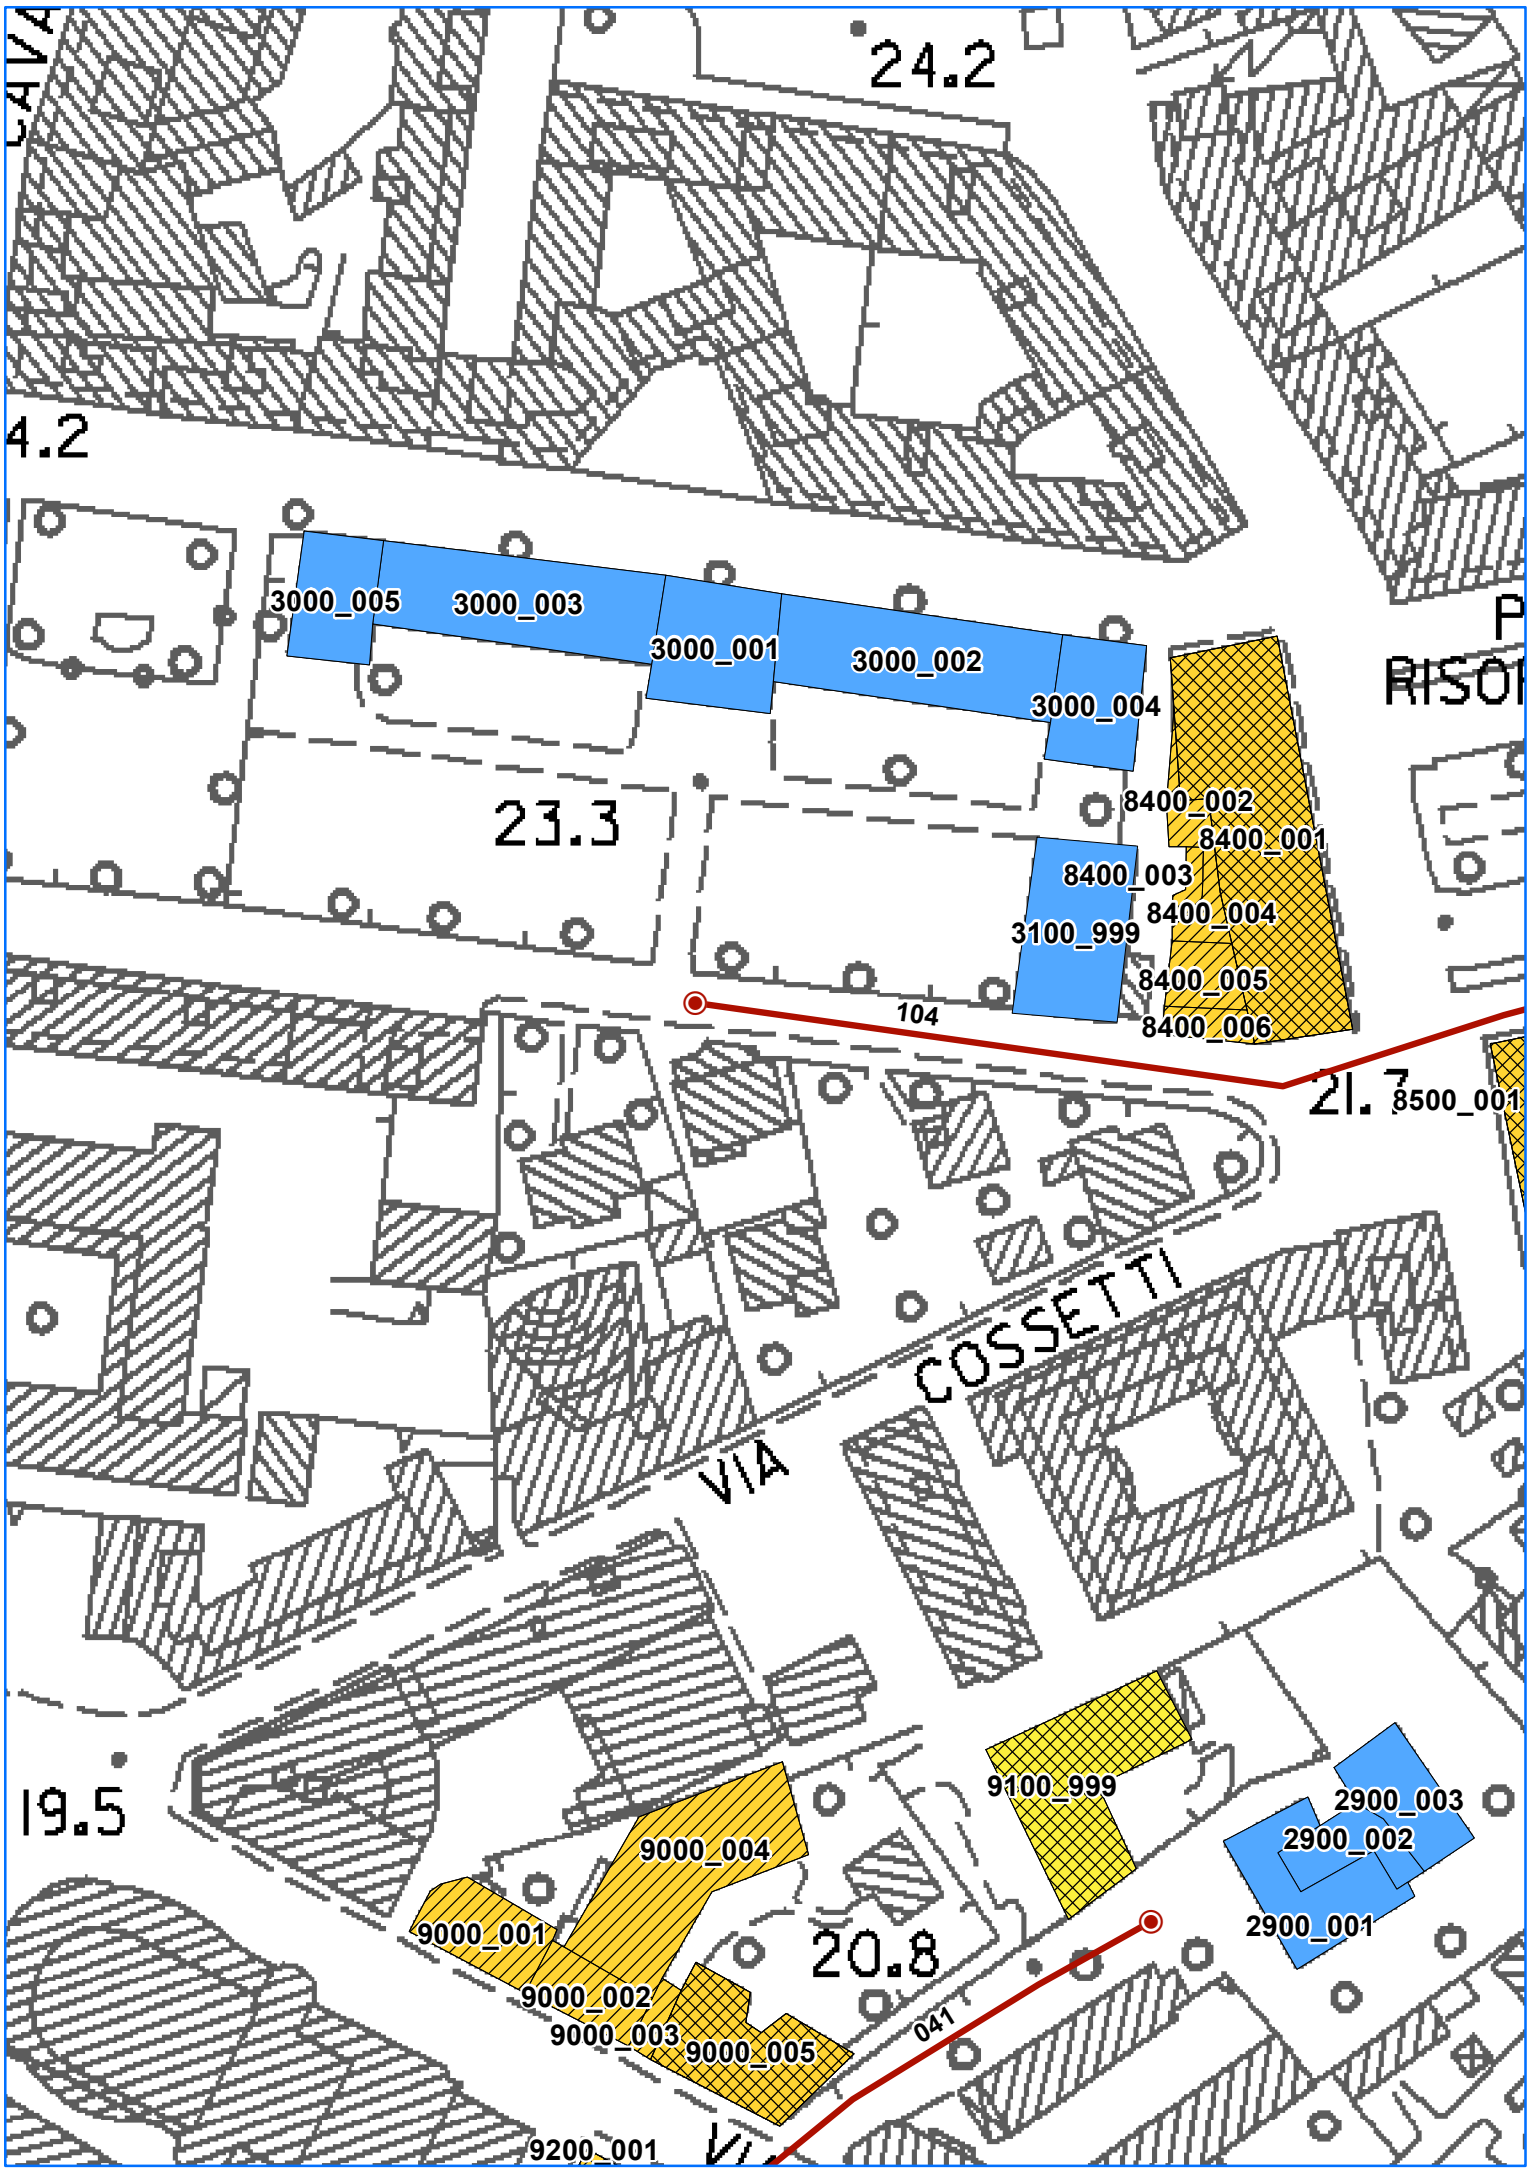
24.2
4.2
3000_005
3000_003
3000_001
3000_002
3000_004
23.3
8400_002
8400_001
8400_003
8400_004
3100_999
8400_005
8400_006
104
21.7
8500_001
COSSETTI
VIA
19.5
9100_999
2900_003
2900_002
2900_001
9000_004
9000_001
20.8
9000_002
9000_003
9000_005
041
9200_001
